

平成23年9月4日発生 土石流災害 桧杖谷 (新宮市南檜杖)



被災状況



【被災状況】


- ・ 死者4名
- ・ 人家4戸、作業所等3棟全壊
- ・ 道路300m浸水



平成23年9月4日発生 土石流災害 桧杖谷（新宮市南檜杖）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=13.5m, L=73.6m）1基及び
渓流保全工を整備し不安定土砂の流出を防止する。

計画平面図

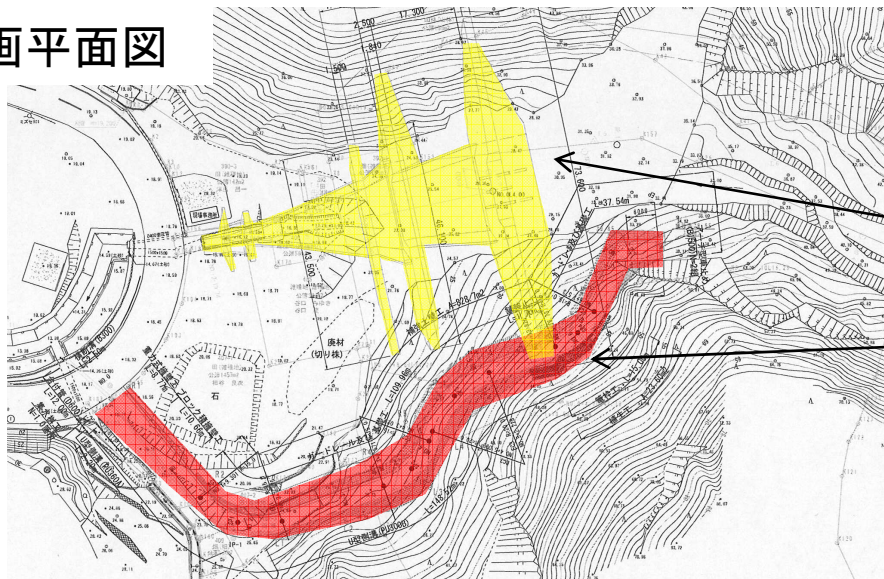

凡例 ■ 施工済（黄色）


■ 施工中（赤色）

砂防えん堤工・渓流保全工は完成


現在管理用道路工を施工中

全体完成予定 平成27年3月末

砂防えん堤工正面図

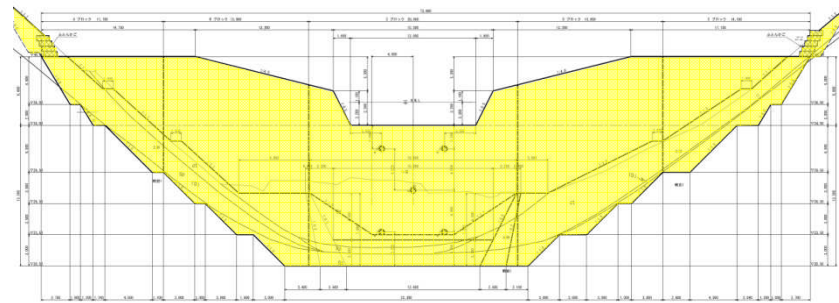


砂防えん堤工側面図

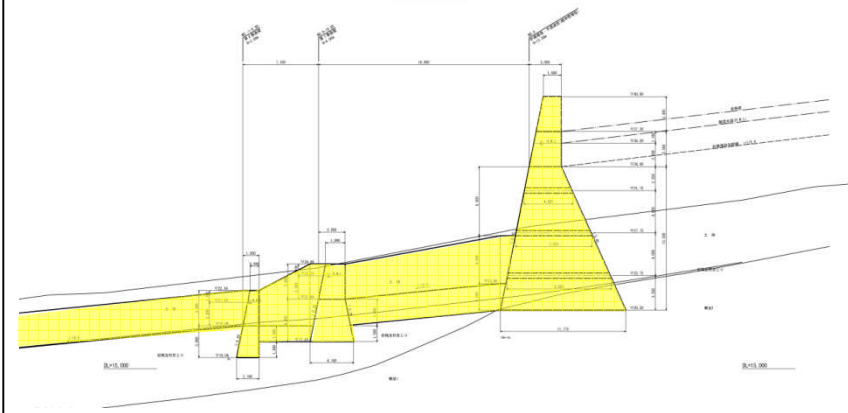

平成23年9月4日発生 土石流災害 桧杖谷（新宮市南檜杖）

進捗状況（平成26年11月19日）

被災時の状況



現在の状況（撮影日：11月19日）



現在の状況

施工：株式会社 海邊組

補強土壁

830m²

補強土壁工施工中
