

平成23年9月4日発生 土石流災害 丸岡谷 (新宮市南檜杖)




【被災状況】

- ・ 人家3戸、事務所1棟全壊
- ・ 人家1戸半壊
- ・ 人家3戸床上浸水
- ・ 道路200m浸水


平成23年9月4日発生 土石流災害 丸岡谷（新宮市南檜杖）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=14.5m, L=58.5m）1基を設置し不安定土砂の流出を防止する。

砂防えん堤工正面図

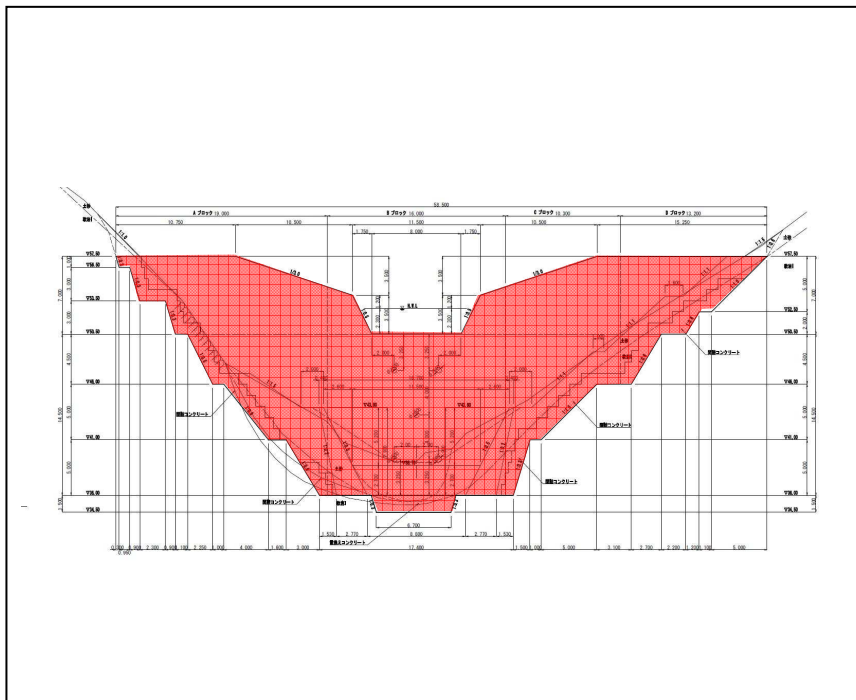

砂防えん堤工側面図

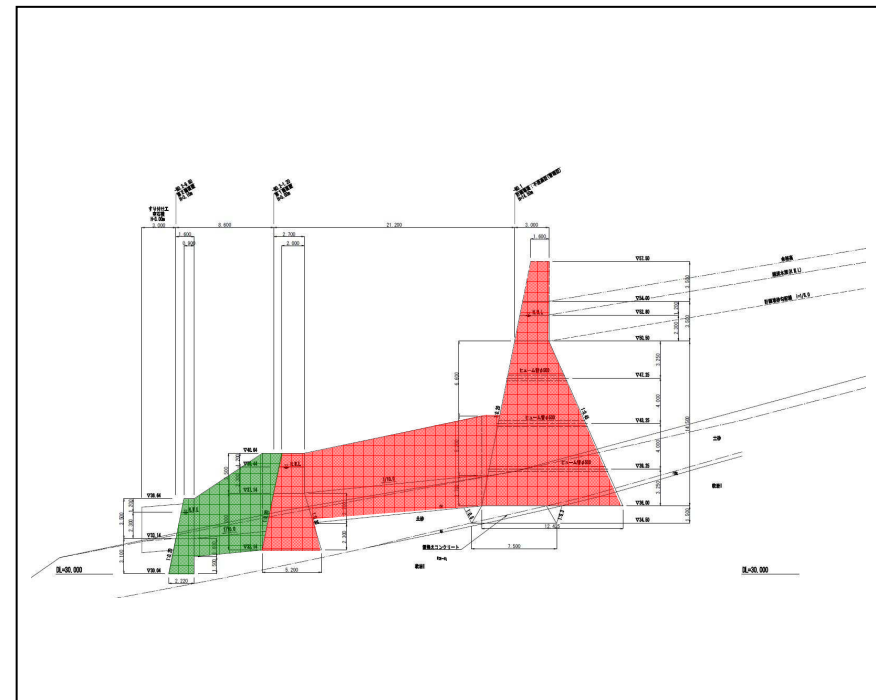


- 凡例
- 昨年度施工（黄色）
 - 本年度施工（赤色）
 - 来年度以降（緑色）

平成23年9月4日発生 土石流災害 丸岡谷（新宮市南檜杖）

進捗状況（平成24年9月30日）

被災状況写真



現況写真



現在の状況

施工：（株）野平組

砂防えん堤工（H=14.5m、L=58.5m）

本堤コンクリート 3,563m³

工事用道路施工中
