

# 平成23年9月4日発生 土石流災害 丸岡谷 (新宮市南檜杖)




## 【被災状況】

- ・ 人家3戸、事務所1棟全壊
- ・ 人家1戸半壊
- ・ 人家3戸床上浸水
- ・ 道路200m浸水

# 平成23年9月4日発生 土石流災害 丸岡谷（新宮市南檜杖）


計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=14.5m, L=58.5m）1基及び  
溪流保全工を整備し不安定土砂の流出を防止する。

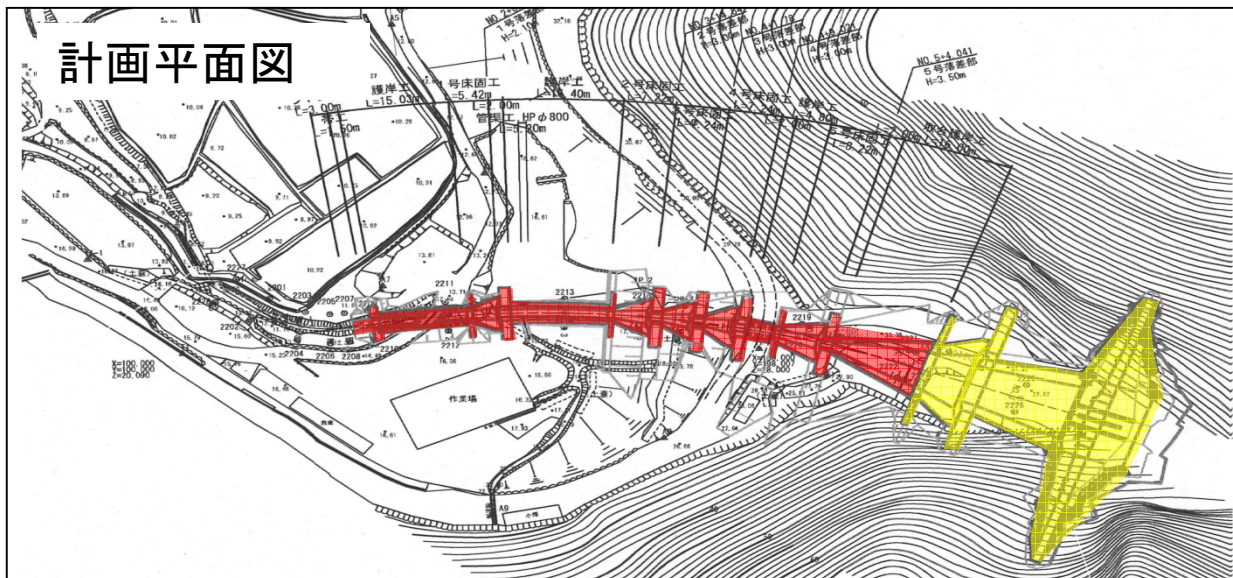


凡例 ■ 施工済（黄色）  
■ 施工中（赤色）

全体完成予定  
平成27年3月末

砂防えん堤工正面図

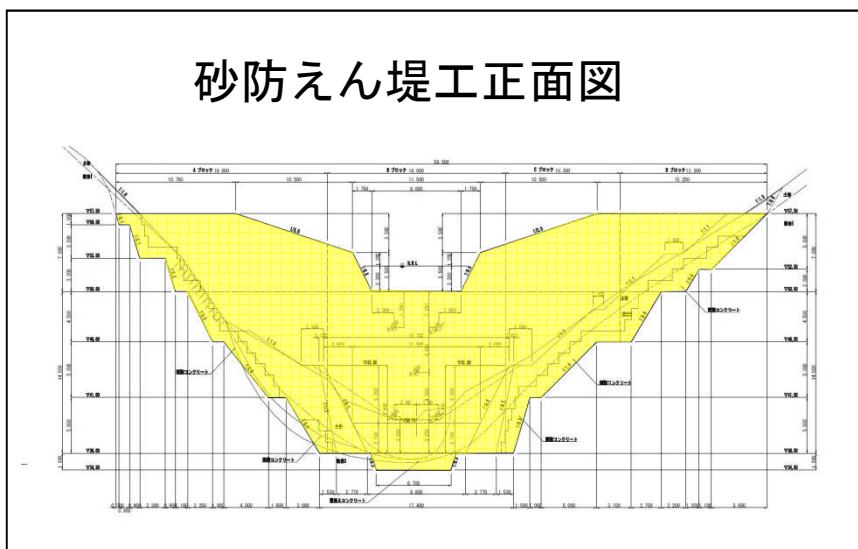

砂防えん堤工側面図

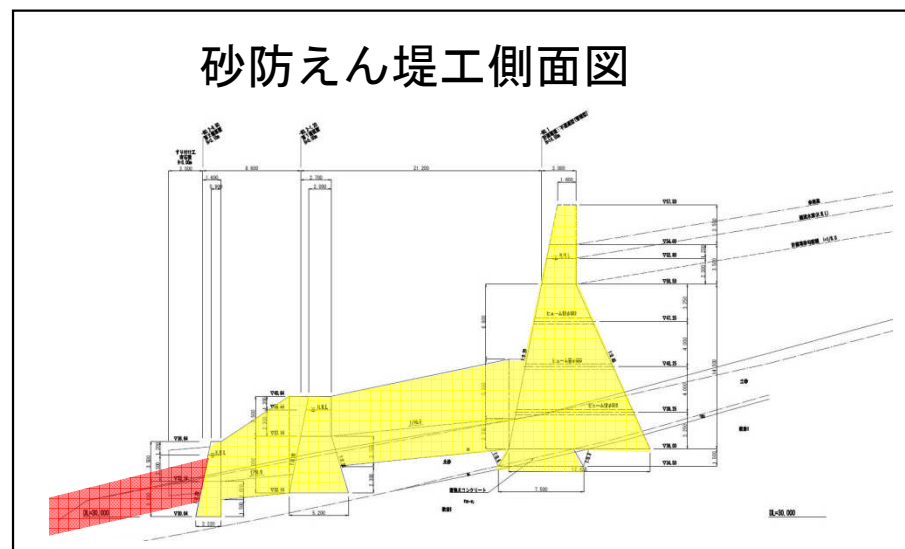

# 平成23年9月4日発生 土石流災害 丸岡谷（新宮市南檜杖）

進捗状況（平成26年8月20日）

被災時の状況



現在の状況（撮影日：8月20日）



現在の状況

施工：（株）加賀建設

NEW

床固工 870m<sup>3</sup>

掘削中

NEW
