

たかの金屋線 道路災害（和歌山県日高郡日高川町高津尾）



通行止め


たかの金屋線 31日間

(平成23年9月4日～10月4日)

たかの金屋線 道路災害（和歌山県日高郡日高川町高津尾）

計画概要

被災した道路を、より災害に強い逆T型の擁壁を用いて復旧を行います。

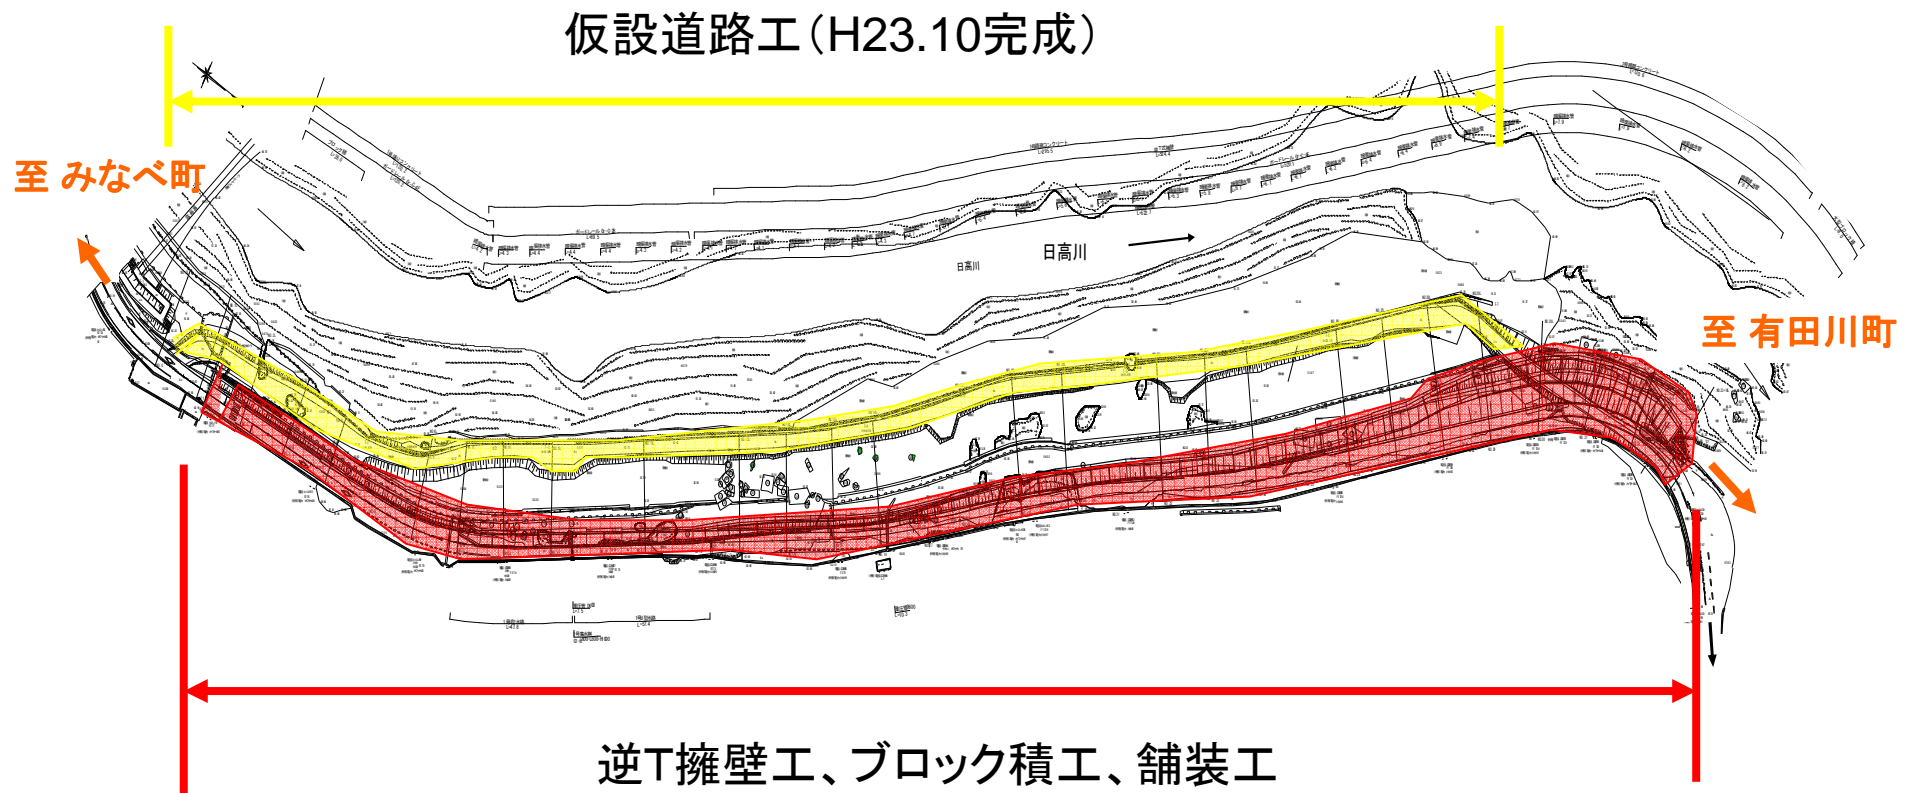

- 凡例
- 昨年度施工 (黄色)
 - 本年度施工 (赤色)
 - 来年度以降 (緑色)

たかの金屋線 道路災害（和歌山県日高郡日高川町高津尾）

進捗状況（平成24年11月8日現在）

被災直後写真



作業状況

施工：株式会社児玉組

逆T擁壁工 1,766m³

ブロック積工 134m²

施工：株式会社小林建設

逆T擁壁工 3,251m³

現況写真



NEW

逆T擁壁コンクリート打設中
