


平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）




平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=12.0m, L=68.6m）1基を設置し不安定土砂の流出を防止する。

砂防えん堤工正面図

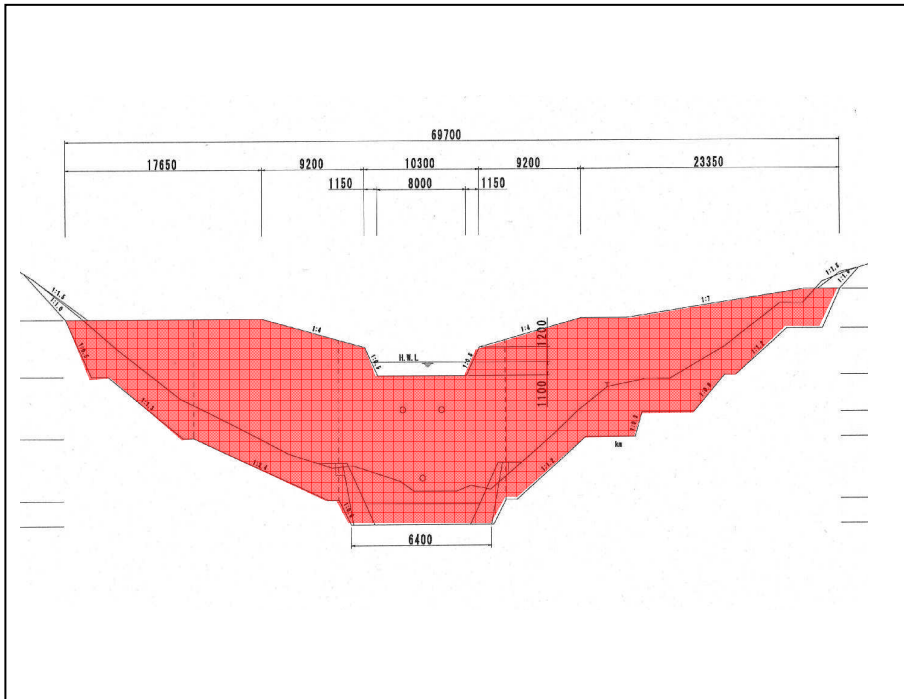

砂防えん堤工側面図

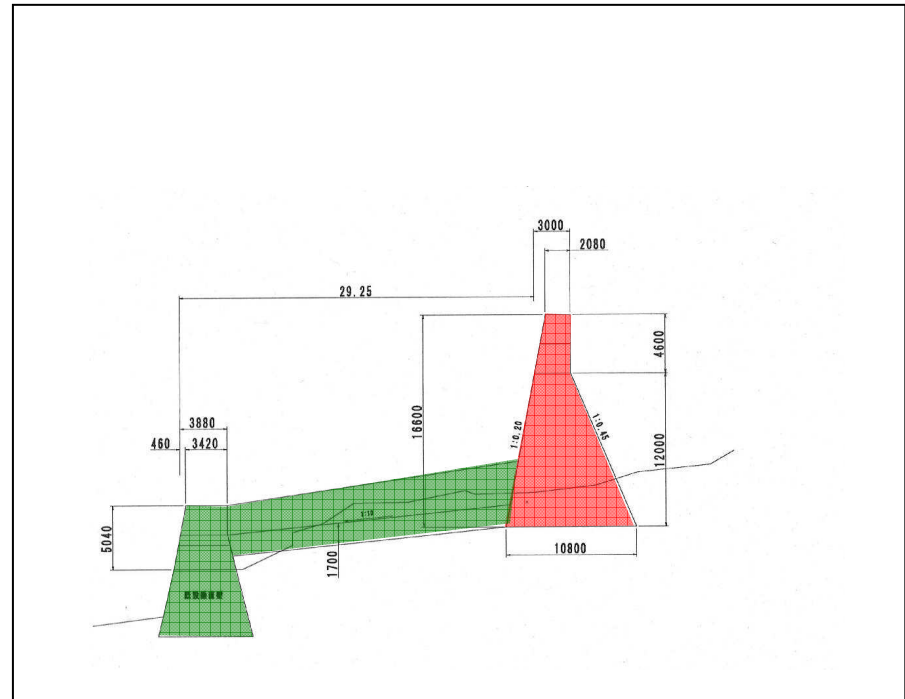

凡例 ■ 施工済(黄色)

■ 施工中(赤色)


■ 次施工(緑色)

平成23年9月4日発生 土石流災害 小谷川（新宮市木ノ川）

進捗状況（平成25年9月26日）

現在の状況（撮影日：9月26日）

被災時の状況



現在の状況

施工：井筒建設(株)

砂防えん堤工（H=12.0m,L=69.7m）

本堤コンクリート 2,371m³

本堤コンクリート打設中
