

平成23年9月4日発生 土石流災害 丸岡谷 (新宮市南檜杖)




【被災状況】

- ・ 人家3戸、事務所1棟全壊
- ・ 人家1戸半壊
- ・ 人家3戸床上浸水
- ・ 道路200m浸水



平成23年9月4日発生 土石流災害 丸岡谷（新宮市南檜杖）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=14.5m, L=58.5m）1基及び
溪流保全工を整備し不安定土砂の流出を防止する。

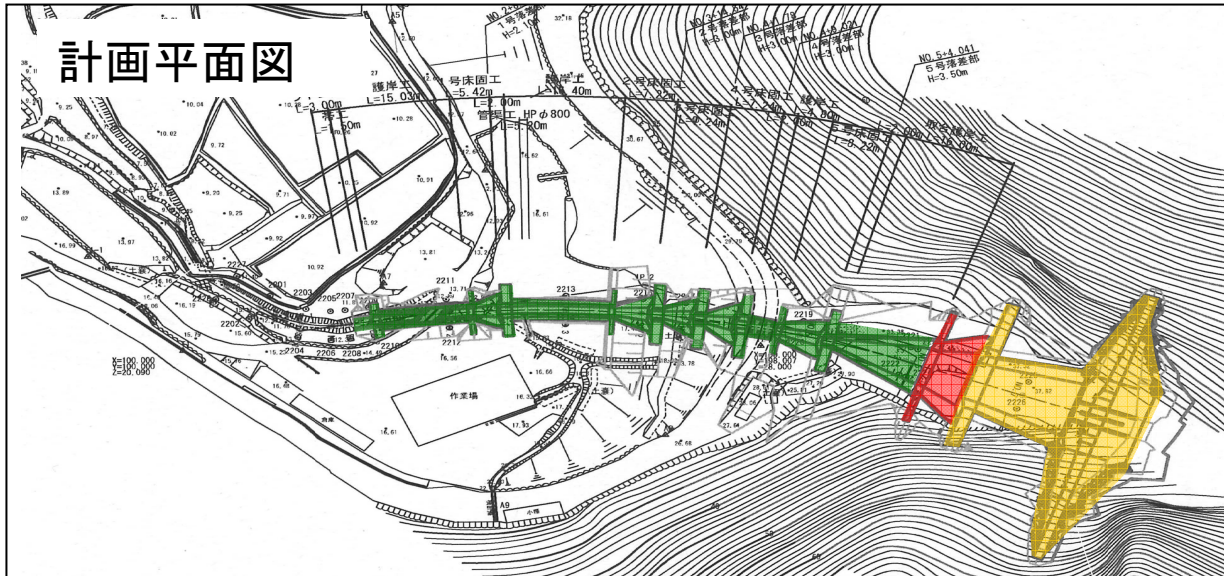

凡例


- 施工済（黄色）
- 施工中（赤色）
- 次施工（緑色）

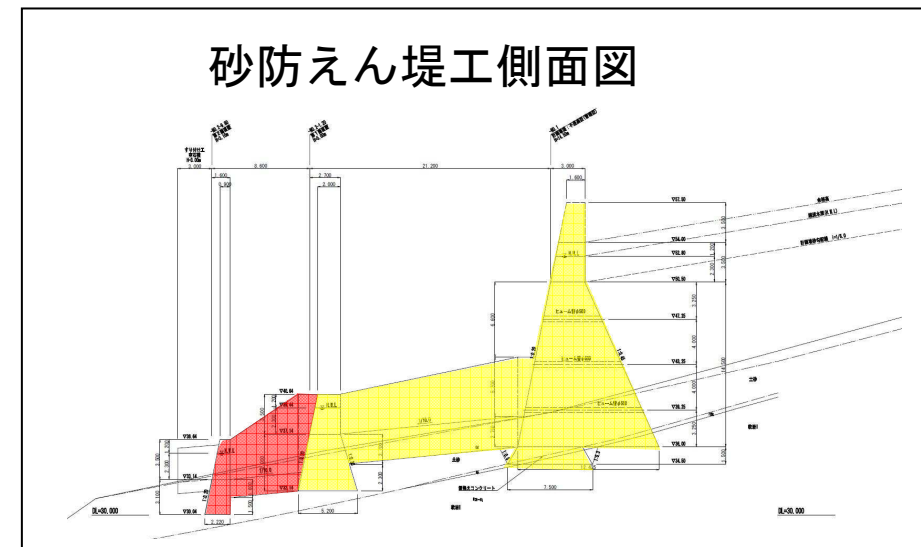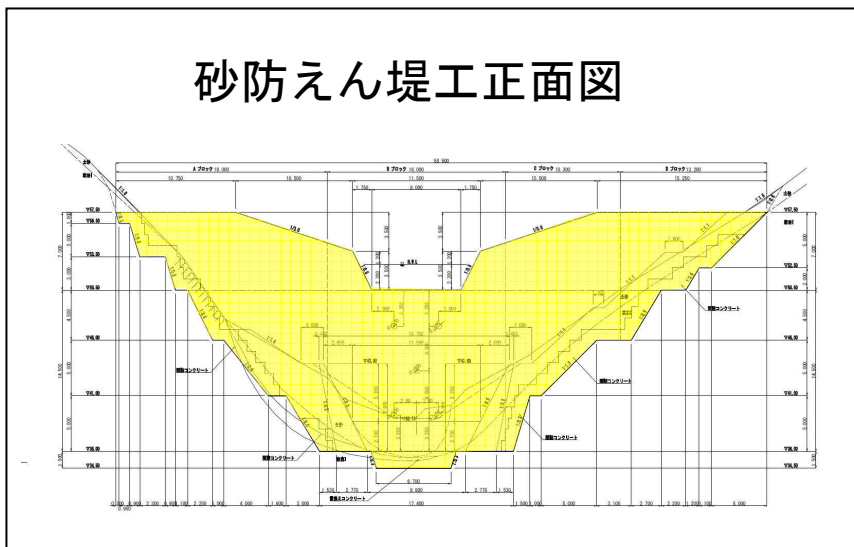

平成23年9月4日発生 土石流災害 丸岡谷（新宮市南檜杖）

進捗状況（平成25年12月25日）

被災時の状況



現在の状況（撮影日：12月25日）



現在の状況

施工：（有）椿本電気商会

垂直壁コンクリート 140m³

垂直壁コンクリート打設中

NEW
