
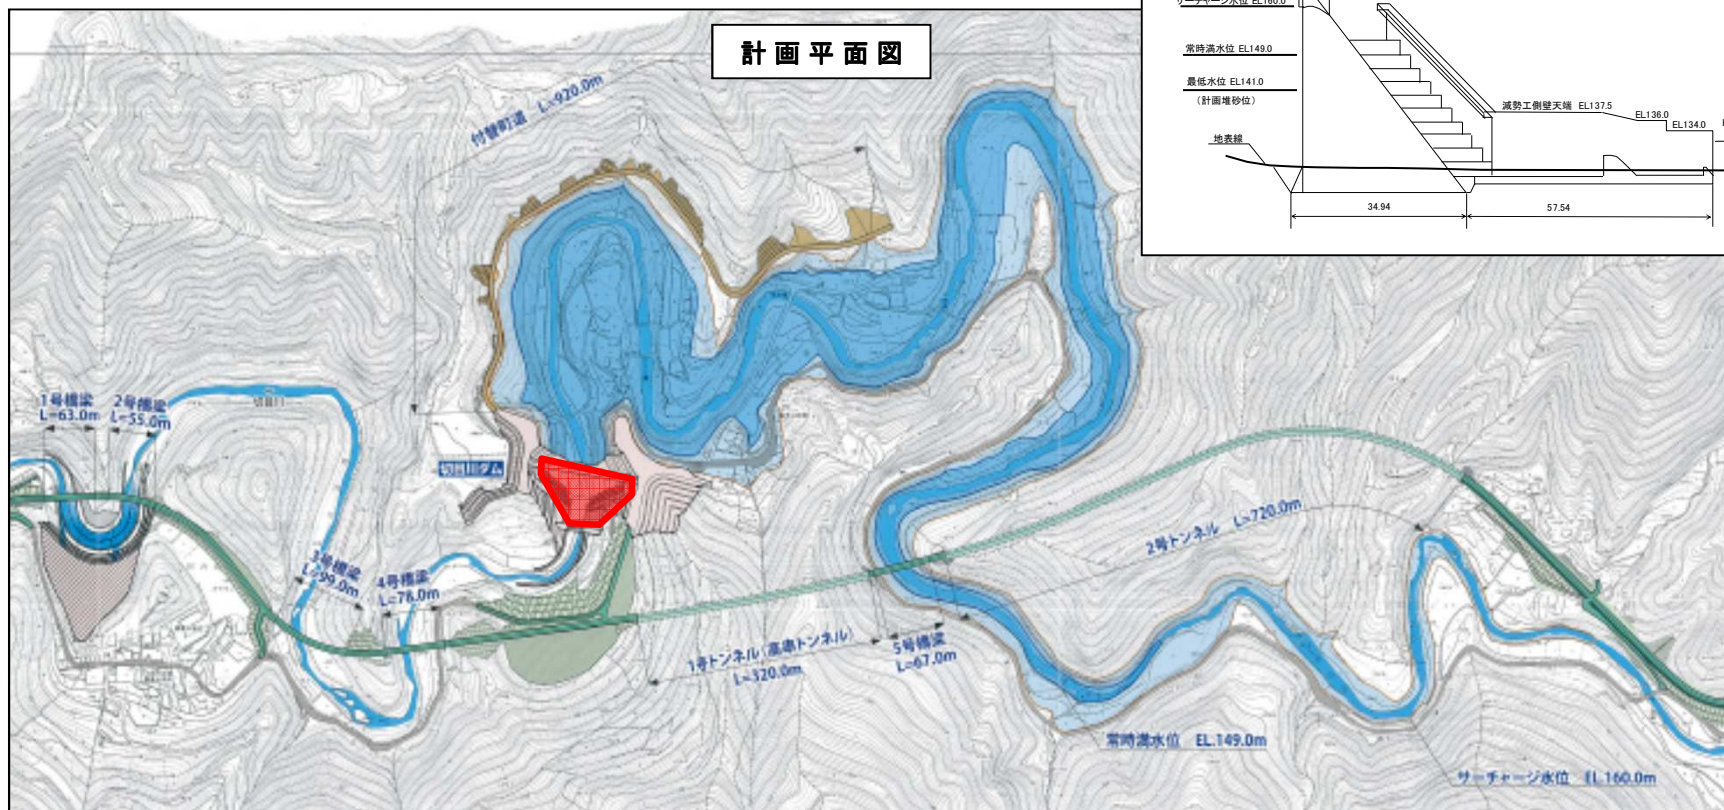


# 切目川ダム本体工事

- 工事名 切目川河川総合開発(切目川ダム本体)工事
- 目的
  - ①洪水調節
  - ②流水の正常な機能の維持
  - ③水道水源の確保
- 工事箇所 日高郡 印南町 高串地内
- 工事概要 重力式コンクリートダム (堤高44.5m 堤頂長127.0m)  
 (基礎掘削工 54,500m<sup>3</sup>、基礎処理工 一式)  
 (堤体工 67,420m<sup>3</sup>、閉塞工 一式、設備工 一式)
- 請負業者 熊谷・浅川・尾花特定建設工事共同企業体

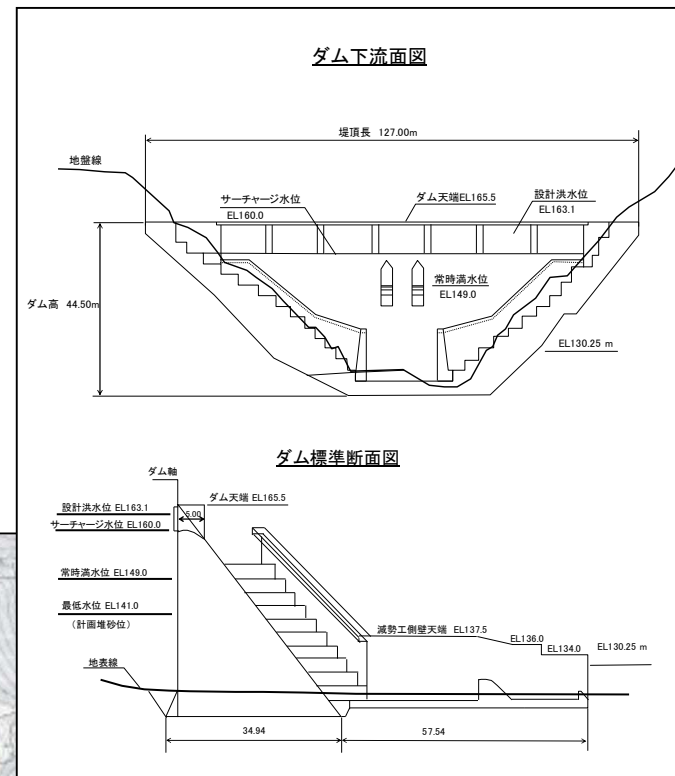


# 切目川ダム本体工事

平成26年11月24日現在 工事進捗状況

現況写真(ダムサイト下流より)



平成24年 5月 (ダムサイト伐採開始)



平成26年 11月 (堤内仮排水路部施工中)
