

切目川ダム本体工事



○工事名 切目川河川総合開発(切目川ダム本体)工事

○目的 ①洪水調節
②流水の正常な機能の維持
③水道水源の確保

○工事箇所 日高郡 印南町 高串地内

○工事概要 重力式コンクリートダム (堤高44.5m 堤頂長127.0m)
〔基礎掘削工 54,500m³、基礎処理工 一式
堤体工 67,420m³、閉塞工 一式、設備工 一式〕

○請負業者 熊谷・浅川・尾花特定建設工事共同企業体

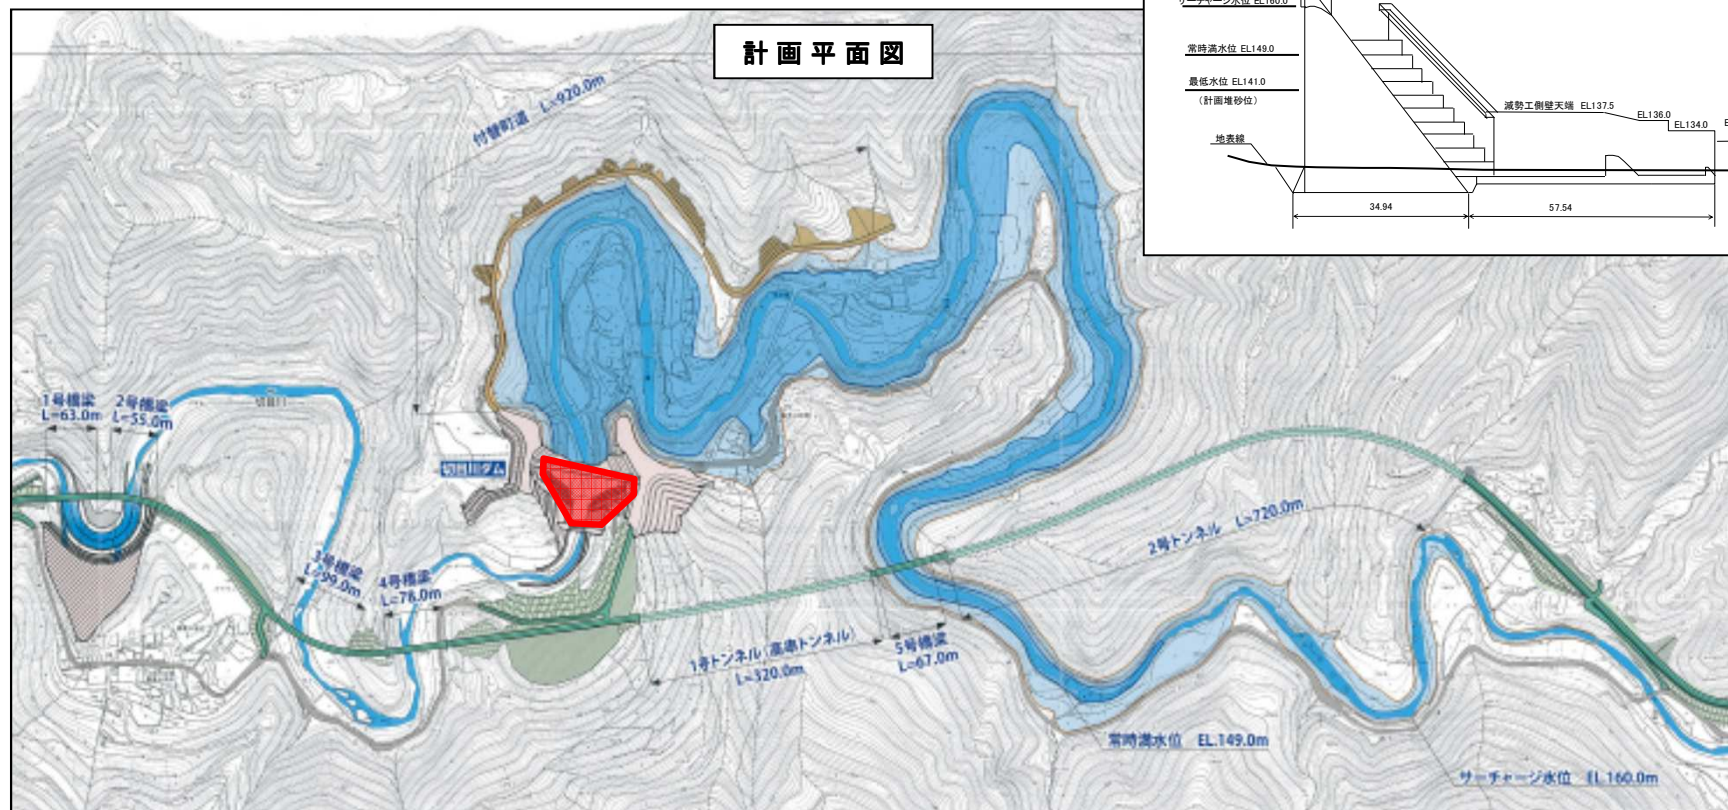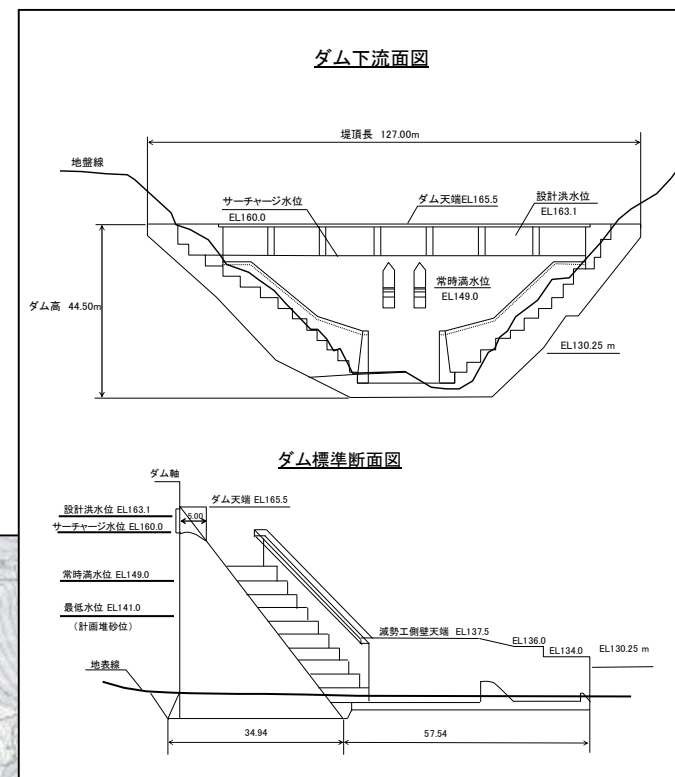


切目川ダム本体工事

平成26年9月22日現在 工事進捗状況

現況写真(ダムサイト下流より)



平成24年 5月 (ダムサイト伐採開始)



平成26年 9月 (堤頂部施工中)
