

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町入野地区で90戸の浸水被害が生じた。



若野橋上流の出水状況



川辺大橋下流の出水状況



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】


計画概要 災害復旧助成事業L=3,571m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする

平成29年3月 災害復旧助成事業 完成




標準横断面図



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

完成(平成29年3月)

被災直後写真




完成写真



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町三十木地区で38戸の浸水被害が生じた。

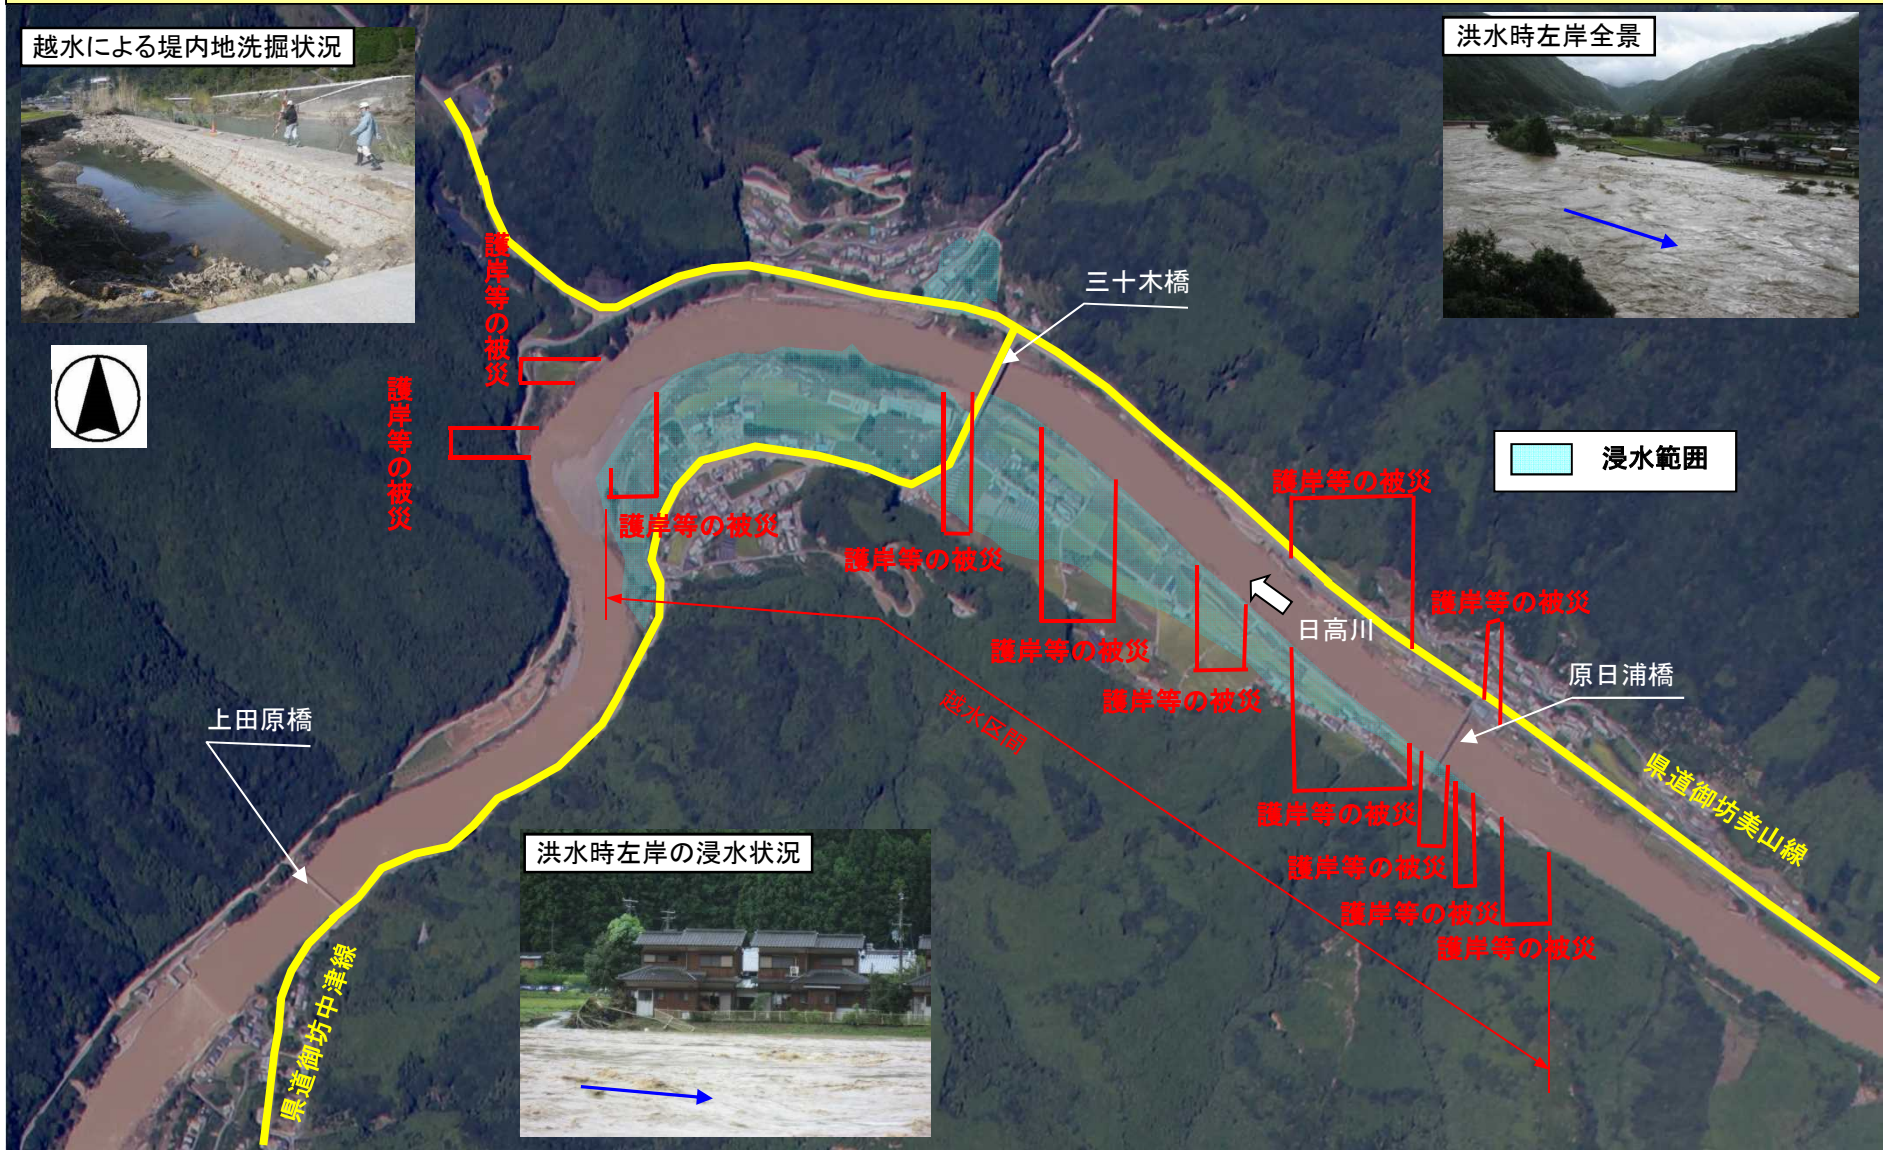

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】


計画概要 災害復旧助成事業L=2,540m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする

平成27年3月 工事完成



標準横断面図




平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

完成写真


完成(平成27年3月)

被災直後写真



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

平成23年9月台風12号により、二級河川日高川が越水氾濫し、日高川町皆瀬地区で103戸の浸水被害が生じた。

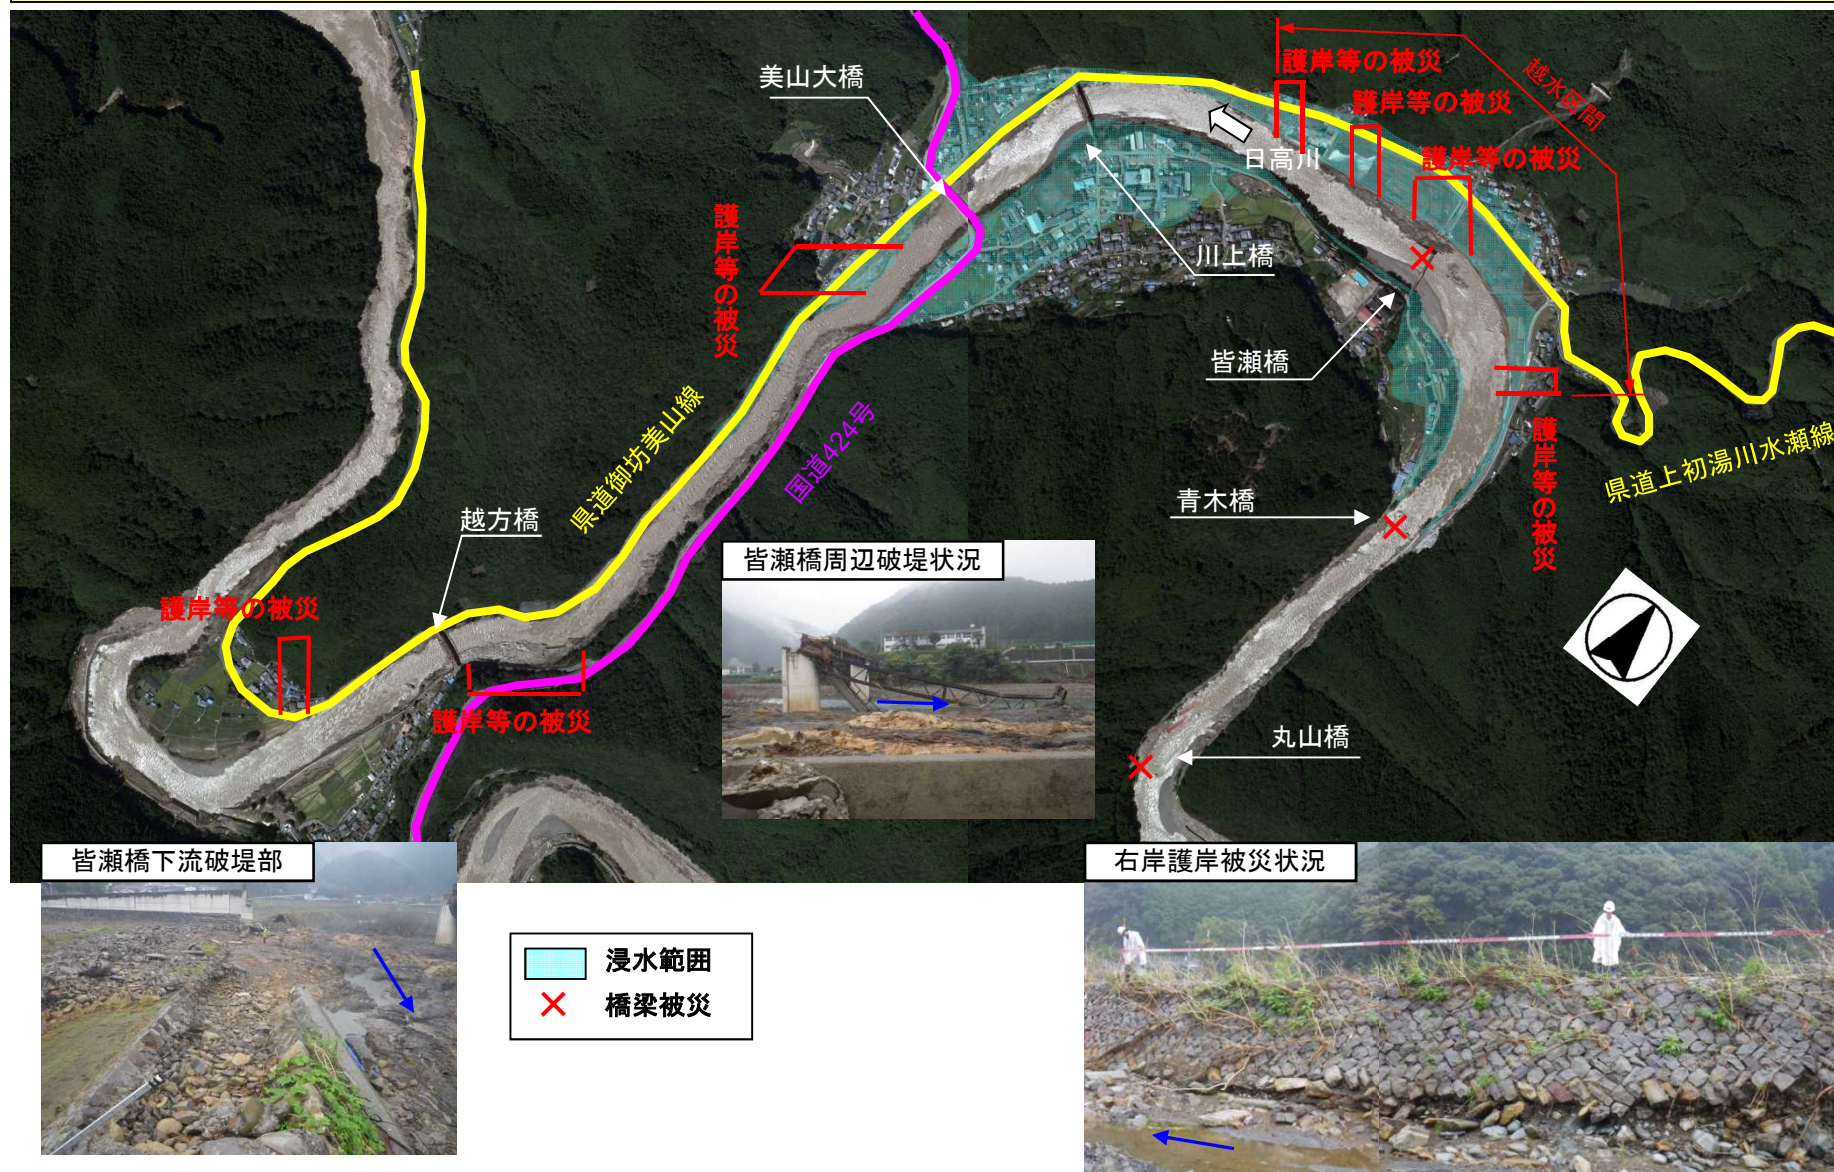

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】


計画概要 災害復旧助成事業L=2,760m

災害復旧と併せて河川断面の拡幅、護岸の築造をする

平成28年3月 工事完成



標準横断図

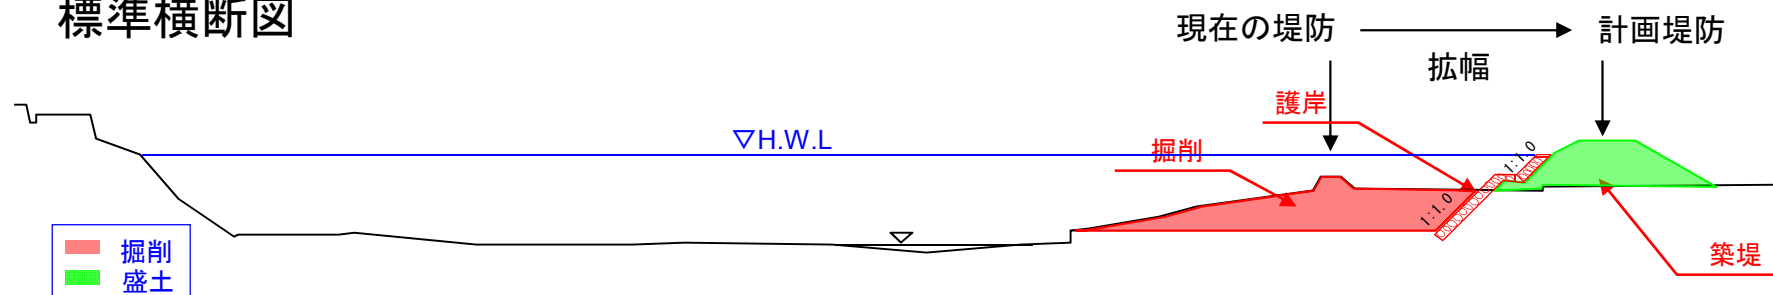


平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

完成写真

完成(平成28年3月)

被災直後写真



平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

途中経過(平成28年4月)

被災直後写真



現況写真



護岸工 施工中

施工状況


施工業者名	施工概要	施工業者名	施工概要
中岡建材	コンクリートブロック張 2, 847㎡	(株)信濃組	コンクリートブロック張 1, 323㎡
(株)清水	コンクリートブロック張 2, 412㎡	(株)美山組	コンクリートブロック張 2, 264㎡
西川興業(株)	コンクリートブロック張 469㎡	(株)芝崎組	コンクリートブロック張 832㎡

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

途中経過(平成27年5月)

現況写真

被災直後写真



施工状況

築堤工、護岸工 施工中

施工業者名	施工概要							
和興建設(株)	旧堤撤去	5, 100㎡	(株)池田土木	コンクリートブロック張	4, 013㎡	(株)西川組	築堤工	2, 900m³
(株)柏木建設	旧堤撤去	11, 600㎡	(株)信濃組	コンクリートブロック張	2, 444㎡	(株)小池組	コンクリートブロック張	1, 043㎡
(株)小林建設	コンクリートブロック張	2, 268㎡	(株)総合建設上平組	コンクリートブロック張	1, 475㎡	(株)芝崎組	コンクリートブロック張	980㎡
(株)西川組	コンクリートブロック張	3, 003㎡	(株)清水	コンクリートブロック張	230㎡	(株)柏木建設	コンクリートブロック張	1, 821㎡
児玉建設	コンクリートブロック張	2, 993㎡	(株)信濃組	コンクリートブロック張	745㎡			
(株)西川組	コンクリートブロック張	3, 283㎡	(株)美山組	コンクリートブロック張	354㎡			

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

途中経過(平成27年5月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



施工状況

施工業者名	施工概要
北村建設(株)	巨石張 443m ²



護岸工 施工中

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

途中経過(平成26年9月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



施工状況

施工業者名	施工概要
(株)古部組	コンクリートブロック張 1,400m ²
(株)西川組	コンクリートブロック張 1,800m ²
(株)小林建設	コンクリートブロック張 2,300m ²
(株)西川組	旧堤撤去 26,600m ³
(株)西川組	コンクリートブロック張 3,300m ²
児玉建設	コンクリートブロック張 2,900m ²
(株)岩本興産	コンクリートブロック張 4,000m ²
(株)西川組	コンクリートブロック張 3,000m ²
(株)池田土木	コンクリートブロック張 3,500m ²
(株)古部組	コンクリートブロック張 1,900m ²
(株)総合建設上平組	コンクリートブロック張 1,500m ²
(株)坂本組	築堤工 4,100m ³
(株)小池組	コンクリートブロック張 1,000m ²
(株)芝崎組	コンクリートブロック張 1,000m ²

築堤工、護岸工 施工中

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

途中経過(平成26年9月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



施工状況

施工業者名		施工概要
(株)古部組	巨石張	500m ²
(株)市川組	巨石張	300m ²
和興建設(株)	巨石張	700m ²
(株)清水	巨石張	700m ²

護岸工 施工中

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

途中経過(平成26年9月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



施工状況

護岸工 施工中

施工業者名	施工概要	
児玉建設	巨石張	600m ²
(株)児玉組	巨石張	400m ²
北村建設(株)	巨石張	500m ²

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

途中経過(平成26年7月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



施工状況

築堤工、護岸工 施工中

施工業者名	施工概要
(株)古部組	コンクリートブロック張 1,400m ²
(株)西川組	コンクリートブロック張 1,800m ²
(株)西川組	コンクリートブロック張 3,300m ²
児玉建設	コンクリートブロック張 2,900m ²
(株)岩本興産	コンクリートブロック張 4,000m ²
(株)古部組	コンクリートブロック張 1,900m ²
(株)坂本組	築堤工 4,100m ³

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

途中経過(平成26年7月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



施工状況

施工業者名	施工概要	
(株)古部組	巨石張	495m ²
(株)市川組	巨石張	302m ²
(株)清水	巨石張	711m ²

護岸工 施工中

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

途中経過(平成26年7月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



施工状況

護岸工 施工中

施工業者名	施工概要
児玉建設	巨石張 638m ²
(株)児玉組	巨石張 384m ²
北村建設(株)	巨石張 501m ²

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

途中経過(平成26年2月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



施工業者名	施工概要
(株)池田土木	コンクリートブロック張 6, 300㎡
(株)古部組	コンクリートブロック張 2, 400㎡
(株)坂本組	コンクリートブロック張 2, 300㎡
青貝建築	水路工 48m

築堤工、護岸工 施工中

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

途中経過(平成26年2月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



施工状況

施工業者名	施工概要
(株)芝崎組	巨石張 2,300㎡
(株)信濃組	巨石張 2,800㎡
(株)上平建設	巨石張 3,100㎡
(株)清水	巨石張 5,200㎡
(株)駒場工務店	巨石張 440㎡
(株)柏木建設	巨石張 430㎡
(株)児玉組	巨石張 3,600㎡

護岸工 施工中

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

途中経過(平成26年2月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



施工状況

護岸工 施工中

施工業者名	施工概要
北村建設(株)	巨石張 1,400m ²
(株)西川組	巨石張 1,100m ²

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

途中経過(平成24年11月)

被災直後写真



現況写真(改良復旧箇所)



施工状況

施工:(株)小池組

河道掘削 23200 m³

河道掘削実施中

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

途中経過(平成24年10月)

被災直後写真



現況写真(原形復旧箇所)



施工状況

コンクリートブロック積 工事中

施工:(株)上平建設

コンクリートブロック積工 338m²

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川入野地区】

途中経過(平成24年8月)

被災直後写真



現況写真(原形復旧箇所)



施工状況

施工:(株)小池組



河道掘削 20000m³

盛土工 完成

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川三十木地区】

途中経過(平成24年8月)

被災直後写真

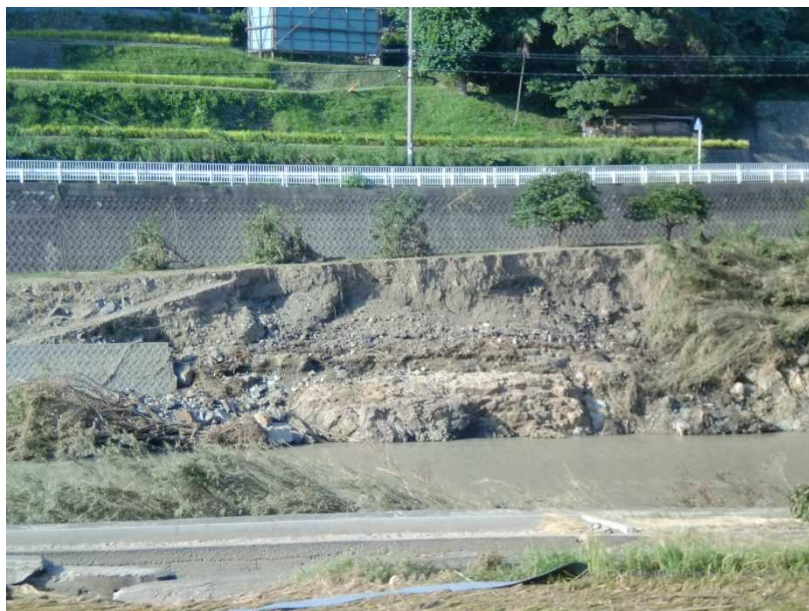

現況写真(原形復旧箇所)



施工状況

コンクリートブロック積 工事中

施工:(株)上平建設

コンクリートブロック積工 338m²

平成23年9月台風12号及び豪雨による被害状況【日高川皆瀬地区】

途中経過(平成24年8月)

被災直後写真



施工状況

施工: タナ力技研(株)

河道掘削 5500m³、大型土のう製作・据付 900袋

現況写真(応急復旧箇所)



大型土のう据付 完成
