

平成23年9月4日発生 土石流災害 門谷（田辺市中辺路町真砂）

通行止め

国道311号

30日間

（平成23年9月4日～
10月4日）




平成23年9月4日発生 土石流災害 門谷（田辺市中辺路町真砂）

計画概要 土石流が発生した箇所に①砂防えん堤工1基、溪流保全工②土石流捕捉工③斜面崩壊対策待ち受け工を設置し不安定土砂の流出を防止する。

9月末

本堤完成予定：平成26年~~6月末~~（今回変更）


理由：法面を掘削すると巨大な浮石が多数あり、その処
理に時間を要したため。

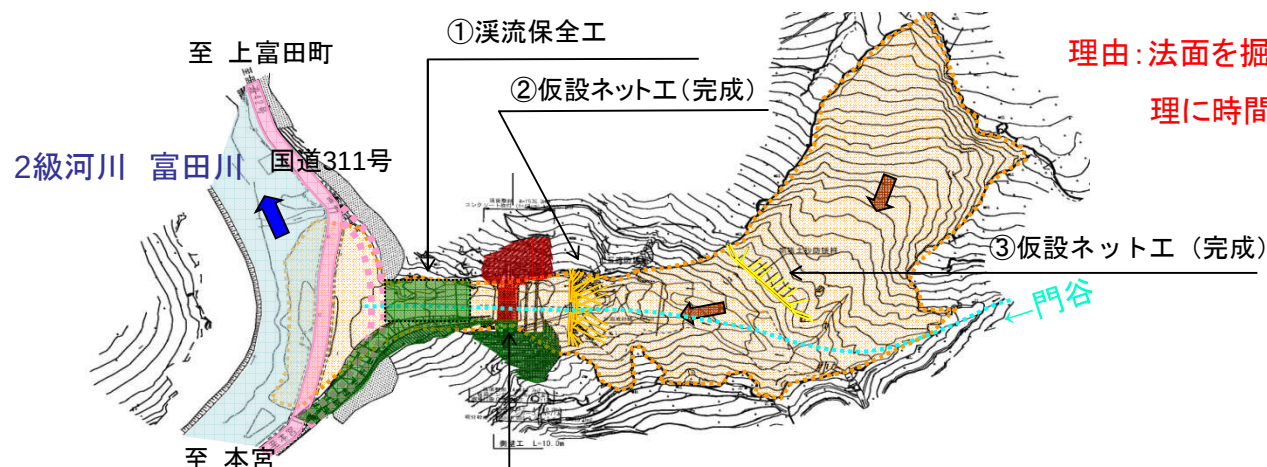

凡例

- 施工済(黄色)
- 施工中(赤色)
- 次施工(緑色)


①砂防えん堤工 (H=14.5m, L=59.5m)

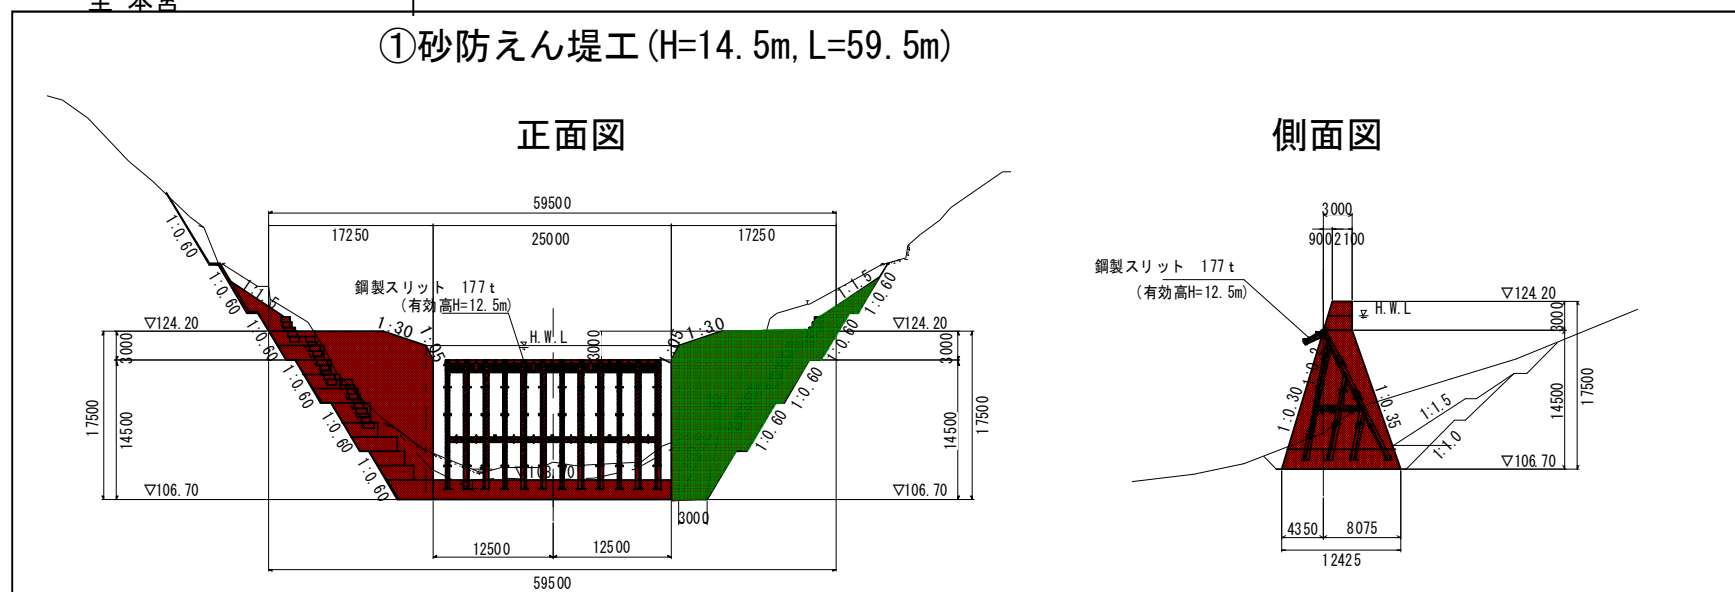

平成23年9月4日発生 土石流災害 門谷（田辺市中辺路町真砂）

進捗状況（平成26年3月25日）

被災時の状況



現在の状況（撮影日：3月25日）



現在の状況

施工：(株)共栄建設工業

①砂防えん堤工（H=14.5m, L=59.5m）

本堤コンクリート 998m³

鋼製スリットえん堤 1式 **完了**
