

平成23年9月4日発生 土石流災害 門谷（田辺市中辺路町真砂）

通行止め

国道311号

30日間

（平成23年9月4日～
10月4日）




平成23年9月4日発生 土石流災害 門谷（田辺市中辺路町真砂）

計画概要 土石流が発生した箇所に①砂防えん堤工1基、溪流保全工②土石流捕捉工③斜面崩壊対策待ち受け工を設置し不安定土砂の流出を防止する。

10月末

本堤完成予定：平成26年9月末(今回変更)

理由：台風11号・12号の大雨の影響により、崩壊地が危険で現場に入れなかったため。

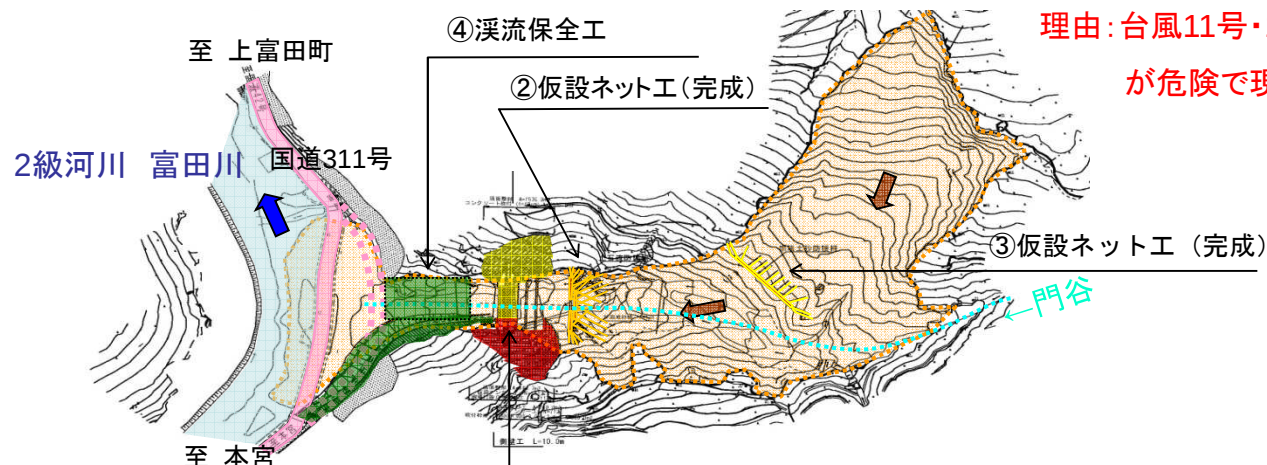


凡例


- 施工済(黄色)
- 施工中(赤色)
- 次施工(緑色)

①砂防えん堤工 (H=14.5m, L=59.5m)

正面図

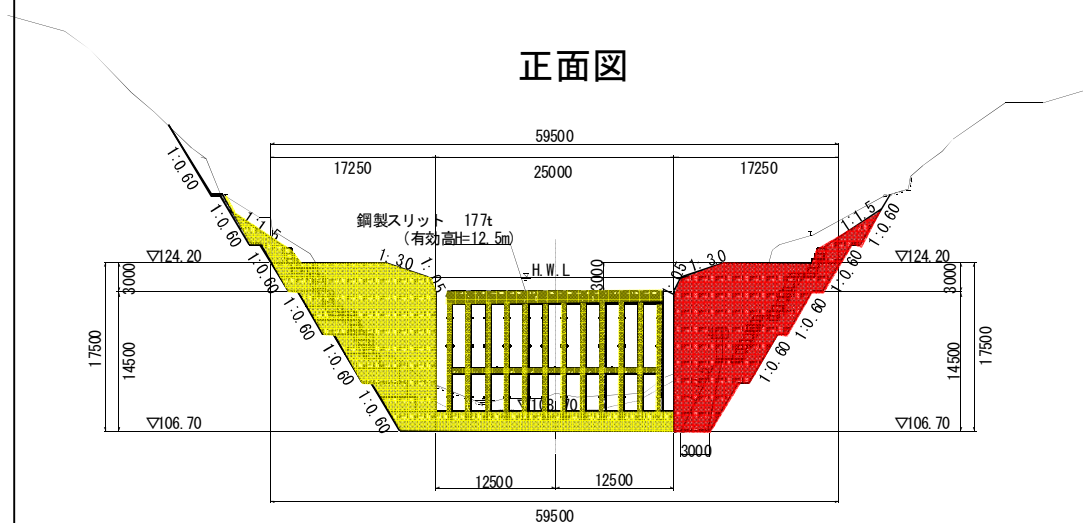


側面図

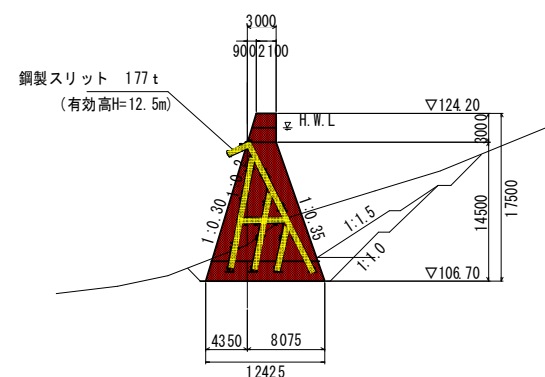

平成23年9月4日発生 土石流災害 門谷（田辺市中辺路町真砂）

進捗状況（平成26年8月21日）

被災時の状況



現在の状況

施工：(株)目良組

本堤コンクリート 1,270m³

現在の状況（撮影日：8月21日）



本堤コンクリート打設中
