

平成23年9月4日発生 土石流災害 桧杖谷 (新宮市南檜杖)



被災状況



【被災状況】


- ・ 死者4名
- ・ 人家4戸、作業所等3棟全壊
- ・ 道路300m浸水




平成23年9月4日発生 土石流災害 桧杖谷（新宮市南檜杖）

計画概要 土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=13.5m, L=73.6m）1基を設置し不安定土砂の流出を防止する。

砂防えん堤工正面図

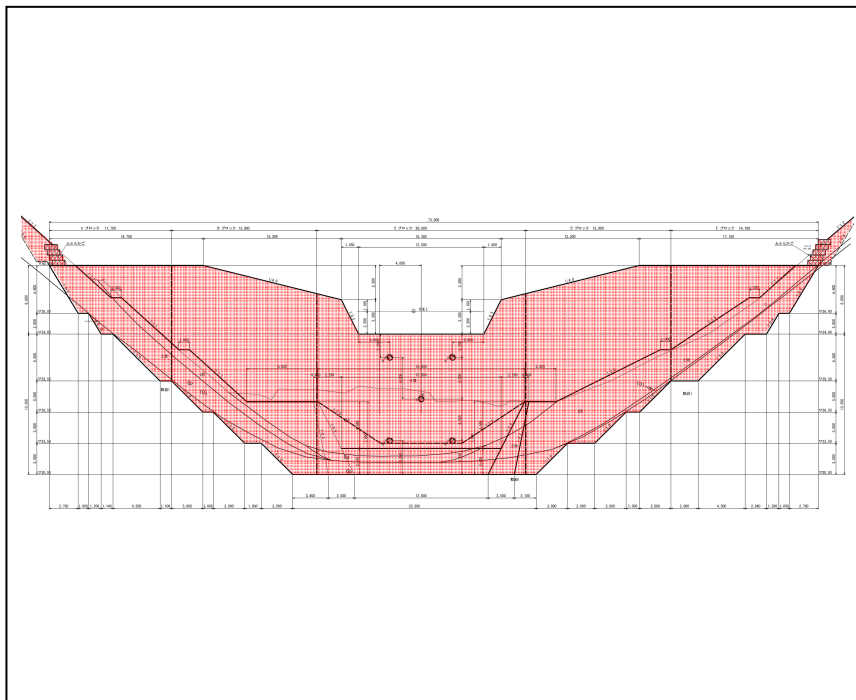

砂防えん堤工側面図

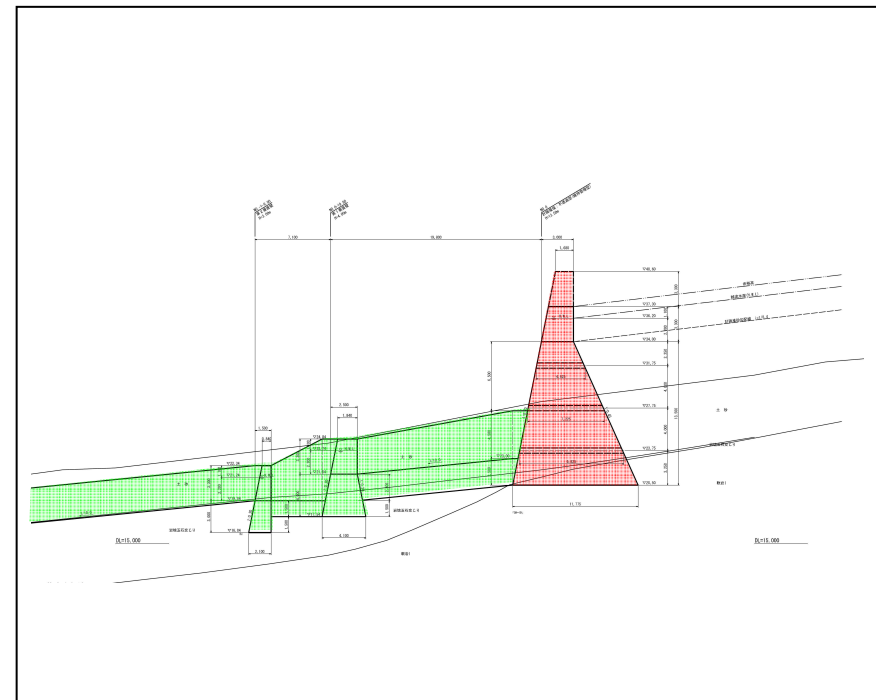


- 凡例
- 施工済（黄色）
 - 施工中（赤色）
 - 次施工（緑色）

平成23年9月4日発生 土石流災害 桧杖谷（新宮市南檜杖）

進捗状況（平成25年8月1日）

被災時の状況



現在の状況（撮影日：8月1日）



現在の状況

施工：(株)松根組

砂防えん堤工（H=13.5m,L=73.6m）

本堤コンクリート 4,550m³

本堤コンクリート打設中
