平成23年9月4日発生　土石流災害　小谷川（新宮市木ノ川）

平成23年９月４日発生　土石流災害　小谷川（新宮市木ノ川）

計画概要　土石流が発生した箇所に砂防えん堤工（H=12.0m,L=68.6m）1基及び渓流保全工を整備し不安定土砂の流出を防止する。

計画平面図

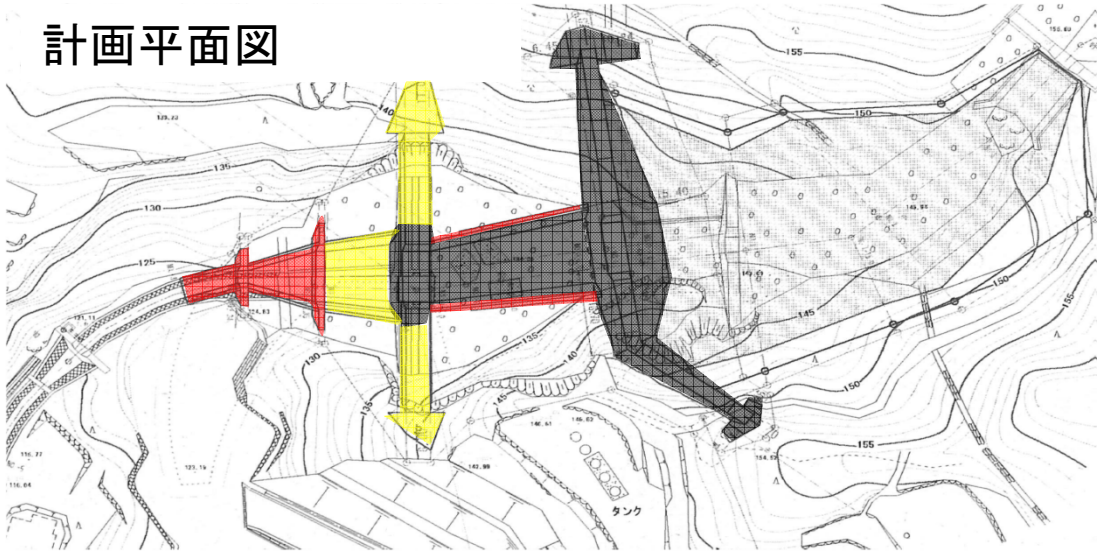

凡例
- ■ 前回完了（黒色）
- ■ 今回完了（黄色）
- ■ 施工中（赤色）

全体完成予定

平成26年12月末

砂防えん堤工正面図

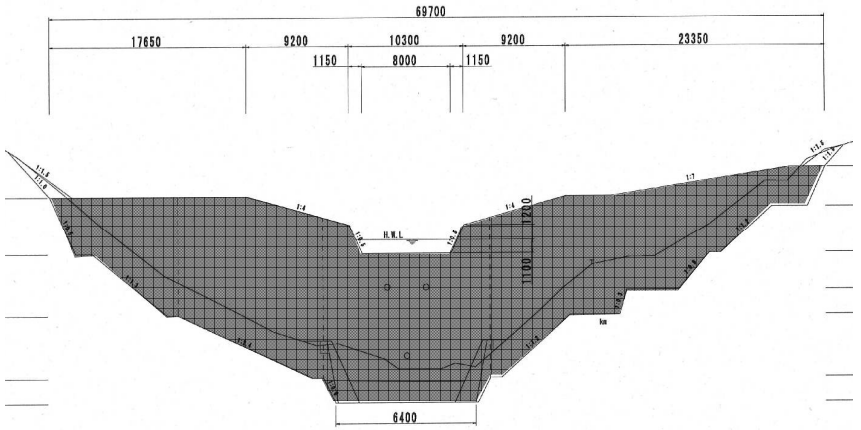

砂防えん堤工側面図

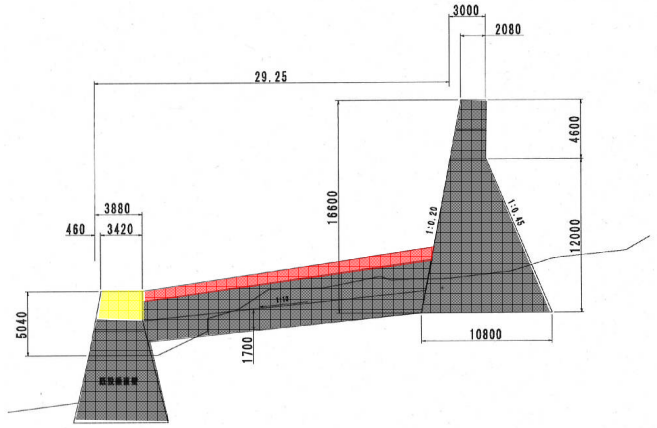

平成23年９月４日発生　土石流災害　小谷川（新宮市木ノ川）

進捗状況（平成26年4月24日）

被災時の状況

現在の状況

施工：㈱坪井組

垂直壁コンクリート　350㎥　完了

施工：福本工務店

ブロック積擁壁　60㎡

帯工コンクリート　10㎥　NEW

現在の状況（撮影日：4月24日）

NEW

NEW

側壁コンクリート打設中　NEW
